

Приложение N 5
к Положению о порядке рассмотрения
инициативных проектов,
выдвигаемых для получения финансовой
поддержки из областного бюджета
в рамках регионального
проекта "Комфортное Поморье"

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория городского округа Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект:
городской округ "Город Архангельск"

2. Наименование инициативного проекта: "Благоустройство территории в районе памятника Авиаторам Севера на площадке набережной Северной Двины".

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта
реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:

28.06.2024 – 26.08.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен

Подрядчик нарушил сроки по текущему ремонту. Работы по благоустройству территории памятника выполнены на 100%. Нарушение сроков связано с продолжительным сроком изготовления и доставки МАФ-ов.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 26.08.2024.

N п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <*>
1	2	3	4
1.	"Благоустройство территории в районе памятника Авиаторам Севера на площадке набережной Северной Двины"	2 619 249,24	ЗАО «Северная роза»
	Выполнение работ по благоустройству территории в районе памятника Авиаторам Севера на площадке набережной Северной Двины	64 000,00	ООО "АрхСтройЗаказ"
	Разработка проектно-сметной документации	110 000,00	ИП Николаева А.М.
	Корректировка проектно-сметной документации	29 000,00	ИП Николаева А.М.
	Проведение проверки достоверности сметной стоимости по договору № 219-ОД/24 от 01.04.24	10 000,00	ГАУ АО "АРЦС"
	Итого	2 832 249,24	


<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<*> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	3 054,22	100	2 683,25	100
объем средств областного бюджета	2 631,26	74,1	2 541,64 ✓	94,7
объем собственных средств местного бюджета	422,96	11,9	141,61 ✓	5,3
объем инициативных платежей физических лиц				
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей				
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта				

5. Фотоматериалы <*>:

№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта

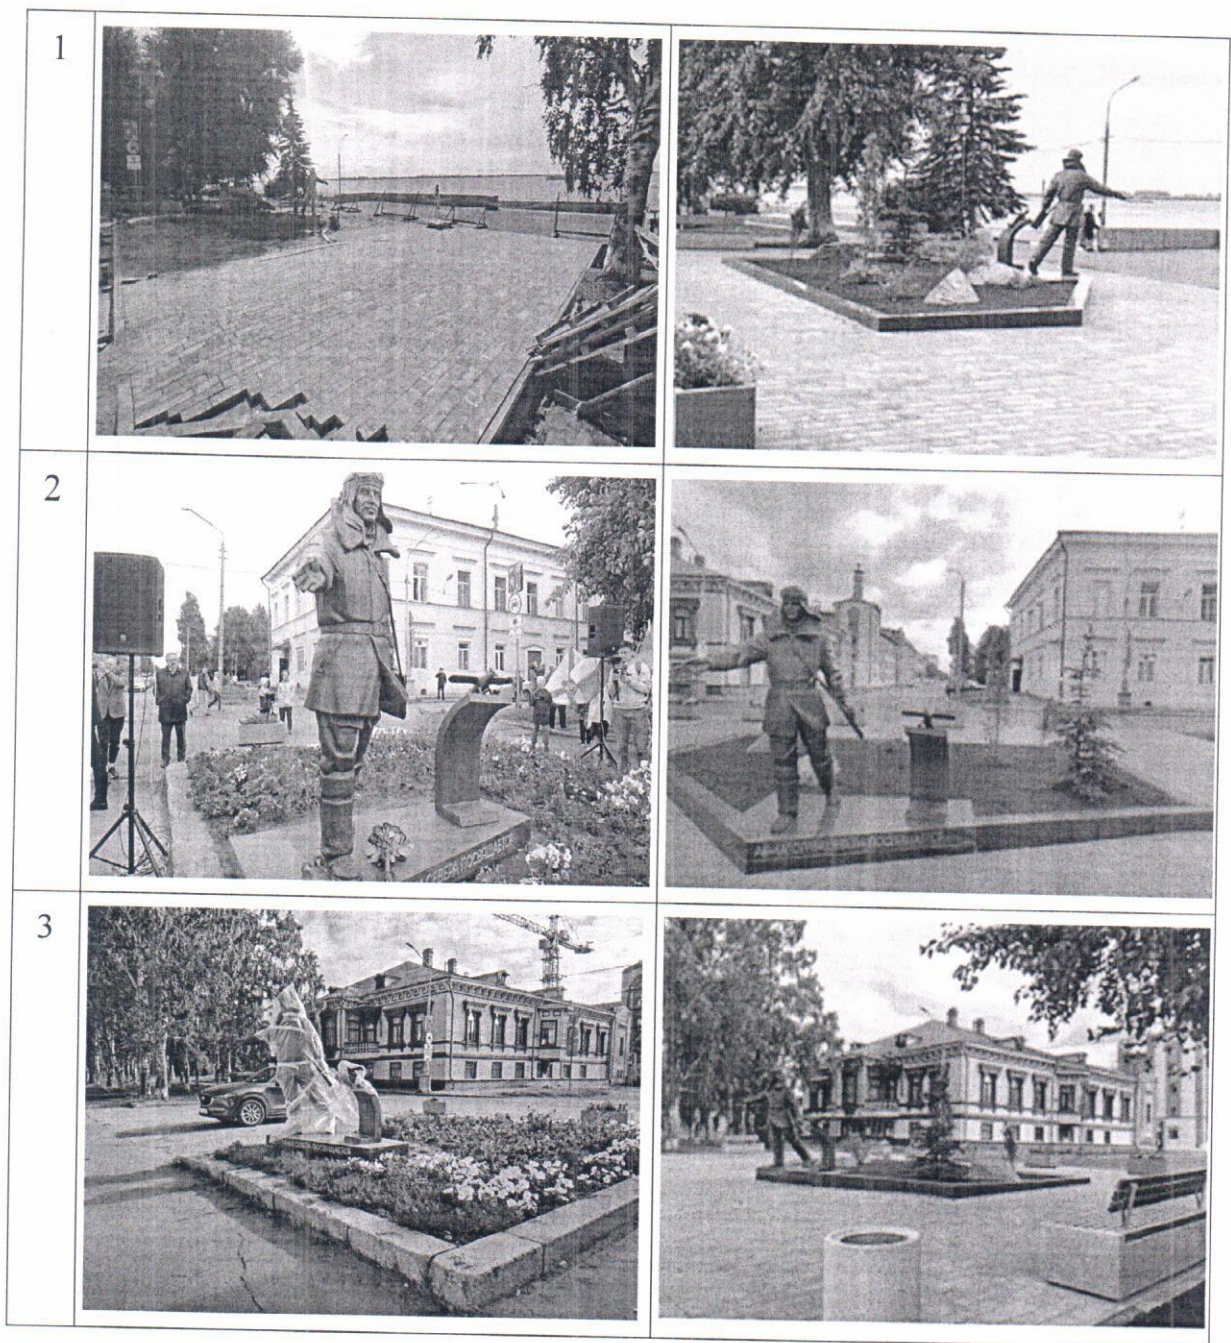

<*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса."

