

ОТЧЕТ

об итогах реализации инициативного проекта

1. Территория городского округа Архангельской области или его часть, в границах которой реализовывался инициативный проект:

городской округ "Город Архангельск"

2. Наименование инициативного проекта: "Устройство асфальтобетонного пешеходного тротуара проезжей части по ул. Ильича от ул. Кировская до АГКБ № 6, ул. Ильича 60" .

3. Информация об итогах реализации инициативного проекта реализован.

(реализован/не реализован)

4. Даты начала и окончания реализации инициативного проекта:
с 28.08.2024 по 31.10.2024.

4.1. Информация о причинах нарушения сроков реализации инициативного проекта, в случае если такой срок нарушен

В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, которые не были учтены муниципальным контрактом от 26.08.2024 № 24000339 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного пешеходного тротуара проезжей части дороги по ул. Ильича заключен муниципальный контракт от 28.10.2024 № 45-Д по устройству подстилающего слоя из песка тротуара проезжей части дороги по ул. Ильича.

4.2. Планируемый срок реализации инициативного проекта в случае нарушения установленного срока 19.12.2024.

№ п/п	Наименование выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта	Стоимость выполненной работы, оказанной услуги, закупленного товара в рамках реализации инициативного проекта <*>	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица и (или) индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, выполнившего работу <*>
-------	--	---	--

1	2	3	4
1	Муниципальный контракт от 26.08.2024 № 24000339 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного пешеходного тротуара проезжей части дороги по ул. Ильича	8 700,944 тыс. руб.	ЗАО "АГСУМ" (в наст. время АО "АГСУМ")
2	Муниципальный контракт от 28.10.2024 № 45-Д на выполнение работ по устройству подстилающего слоя из песка тротуара проезжей части дороги по ул. Ильича	599,000 тыс. руб	ЗАО "АГСУМ" (в наст. время АО "АГСУМ")
3	Договор № 364-ОД/24 оказания услуги по проведению проверки достоверности сметной стоимости объекта: "Устройство асфальтобетонного пешеходного тротуара проезжей части дороги по ул. Ильича от ул. Кировская до АГКБ № 6 ул. Ильича, 60"	12,000 тыс. руб	ГАУ АО "АРЦС"
4	Расчистка площадей от кустарника, демонтаж деревянных тротуаров, восстановление газона на объекте: "Устройство асфальтобетонного пешеходного тротуара проезжей части по ул. Ильича от ул. Кировская до АГКБ № 6 ул. Ильича, 60"	Трудовое участие (объем работ на сумму 594,544 тыс. руб.)	Лапин Денис Викторович
	Итого	9 906,488 тыс. руб.	

<*> В случае если работа (услуга) или закупка осуществлена посредством имущественного либо трудового участия, указывается отметка: "имущественное участие" либо "трудовое участие".

<***> В случае участия физических лиц в реализации инициативного проекта посредством трудового участия указываются сведения о количестве физических лиц, принявших такое участие.

Сведения о поступлении и расходовании средств на реализацию инициативного проекта	Планируемый объем средств		Фактический объем средств	
	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)	сумма (тыс. рублей)	доля в общей сумме (процентов)
1	2	3	4	5
Всего на реализацию инициативного проекта, в том числе:	9 475,059	100	9 311,944	100,00
объем средств областного бюджета	8 158,084	86,10	8 158,084	87,61
объем собственных средств местного бюджета	1 316,974	13,90	1153,860	12,39
объем инициативных платежей физических лиц	-	-	0	0
объем инициативных платежей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	0		0	
Причины отклонения от запланированной стоимости инициативного проекта	Расторжение контракта № 24000339 по обоюдному согласию сторон в части неисполненных обязательств на сумму 147,016 тыс. руб. Оставшийся объем работ по Контракту Подрядчиком не выполняется.			

5. Фотоматериалы <*>:


№ п/п	Фотография объекта до реализации инициативного проекта	Фотография объекта после реализации инициативного проекта
-------	--	---

1



2



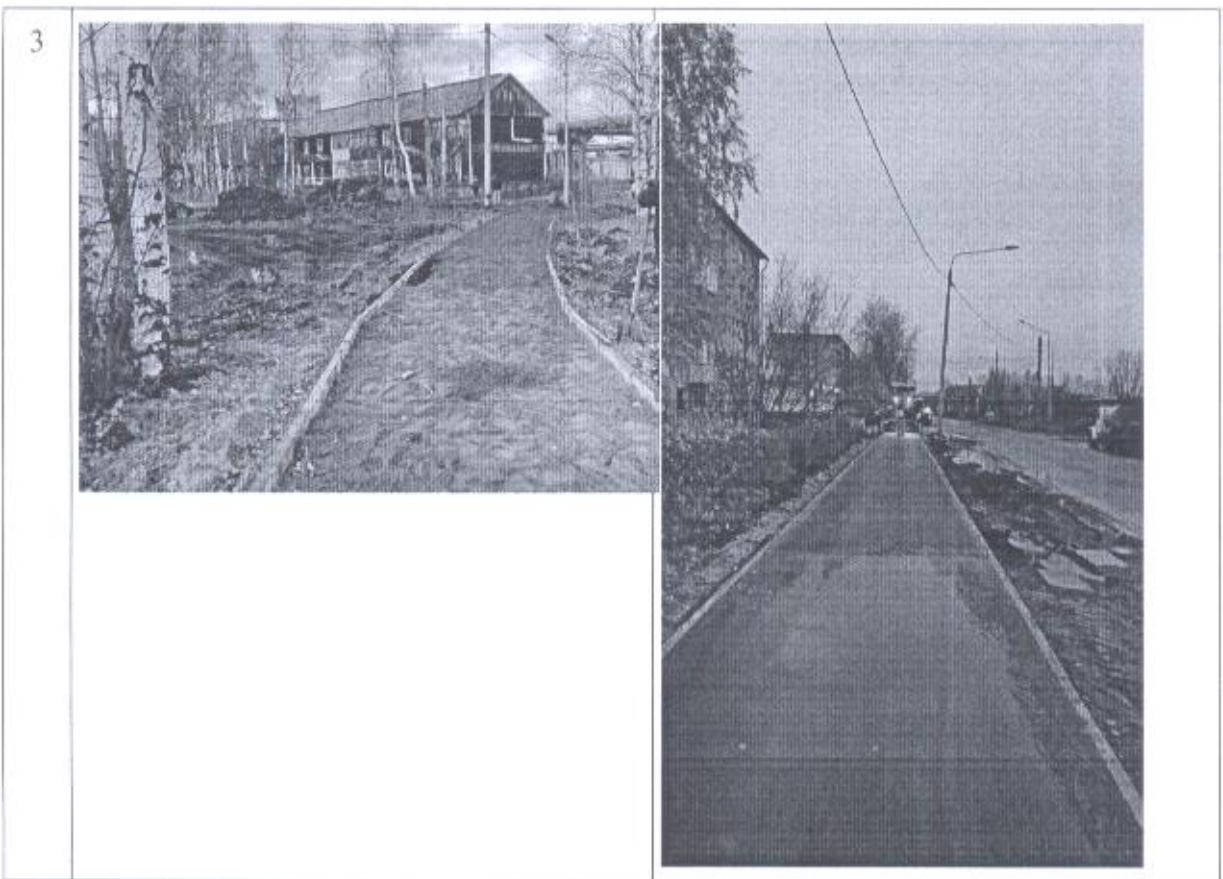

<*> Приложить от 3 до 5 фотографий объекта до и после реализации инициативного проекта, снятых с одного и того же ракурса."

Глава администрации
Северного территориального округа



Г.Г. Шукюров
